
ÖN ONAYA SUNULAN TASLAK — ÜRETİM/STATİK PROJESİ DEĞİLDİR

PORTMAN | Bayi CK-01 / CK-01 birinci kat | İş Emri IE22-CK01-KAT1 r01


KAT PLANI — AKSLI

CK-01 birinci kat | 6 PANO x 5 PANO + 58,5 cm | 763 × 706 cm | Model ve ölçüler: cm | 125,5 cm aks düzeni

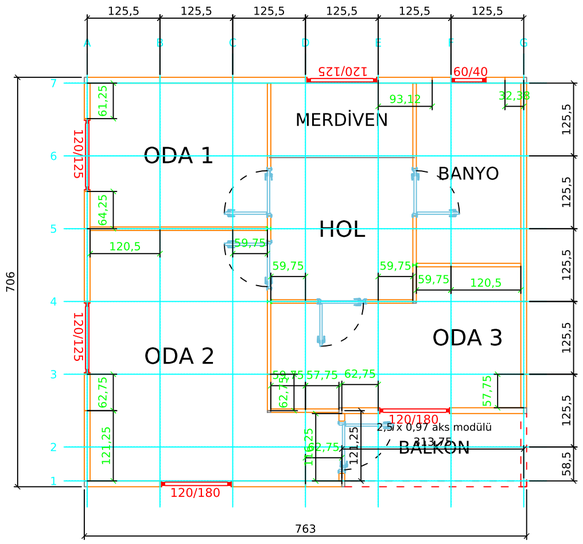


KAT PLANI — NET ALANLAR

CK-01 birinci kat | 6 PANO x 5 PANO + 58,5 cm | 763 × 706 cm | Net alanlar oda adının altında, m²

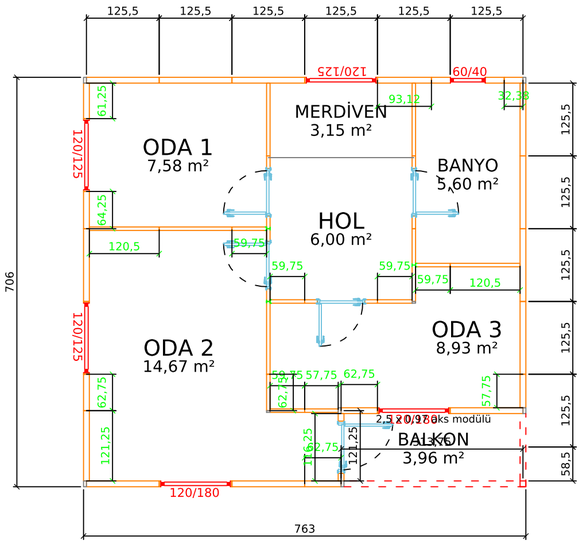

SAHA MONTAJ PLANI

CK-01 birinci kat | 6 PANO x 5 PANO + 58,5 cm | 763 × 706 cm | Standart dışı panolar mor ve ölçülü

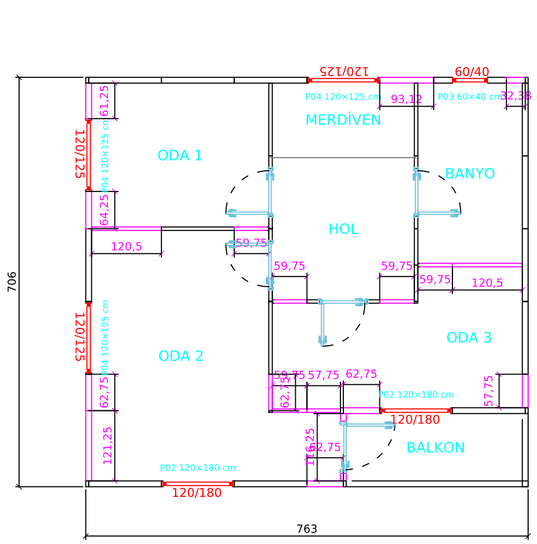


TEKNİK ÖZELLİKLER	
Bina / pano grid	6 pano × 5 pano + 58,5 cm — 763 × 706 cm
Sistem	Prefabrik panel (8 mm fibercement)
Duvar yüksekliği	250 cm
Dış duvar / iç duvar	100 mm / 60 mm
Pano modülü	125,5 cm (isteğe bağlı yarım pano 62,75 cm)
Çatı	Besik — %33 eğim, 30 cm saçak, 10 cm topuk
Pencereler	PVC doğrama; 60×40, 120×125, 120×180
Kapılar	Dış: çelik kapı; iç: Amerikan panel kapı
Kat sayısı	1
Revizyon	r01

Pencereler pano ortasında. Pencere üstünden duvar üstüne (lento): 50 cm.
Net alanlar kapı eşikleri hariç; veranda alanı açık dış kenarlara kadardır.
Açık mahal sınırları bitişik duvar yüzünün devamı kabul edildi.

Mor: standart dışı pano (gerçek uçtan uca boy ölçülü) | Beyaz: standart 125,5 cm pano | Ölçüler cm
Pencere etiketi: malzeme kodu + en×yükseklik | Montaj kopyası BOM'a sayılmaz


ÖN GÖRÜNÜŞ - ÇALIŞMA

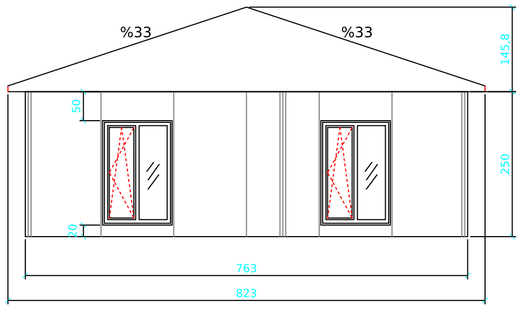

Pencere üst kotu 200 cm | Lento 50 cm | Bina yüksekliği 250 cm

ÇATI PROFİLİ - TOPUK VE SAÇAK

İki yanda 30 cm saçak | İki uçta 10 cm topuk | Eğim %33 (derece değil)



Makas kısa kenarı geçer; mahya uzun kenar boyunca uzanır. Ölçüler cm.

Duvar: 10 / 6 cm | Yükseklik: 250 cm | Pano: 125,5 cm | Çatı: %33

Kural kaydı v1.4.3 ile üretildi. Yan görünüş ve üretim/statik hesabı bu taslağın kapsamında değildir.

Portman motor v1.1 | Üretim: 2026-10-28 07:10:47 UTC
